


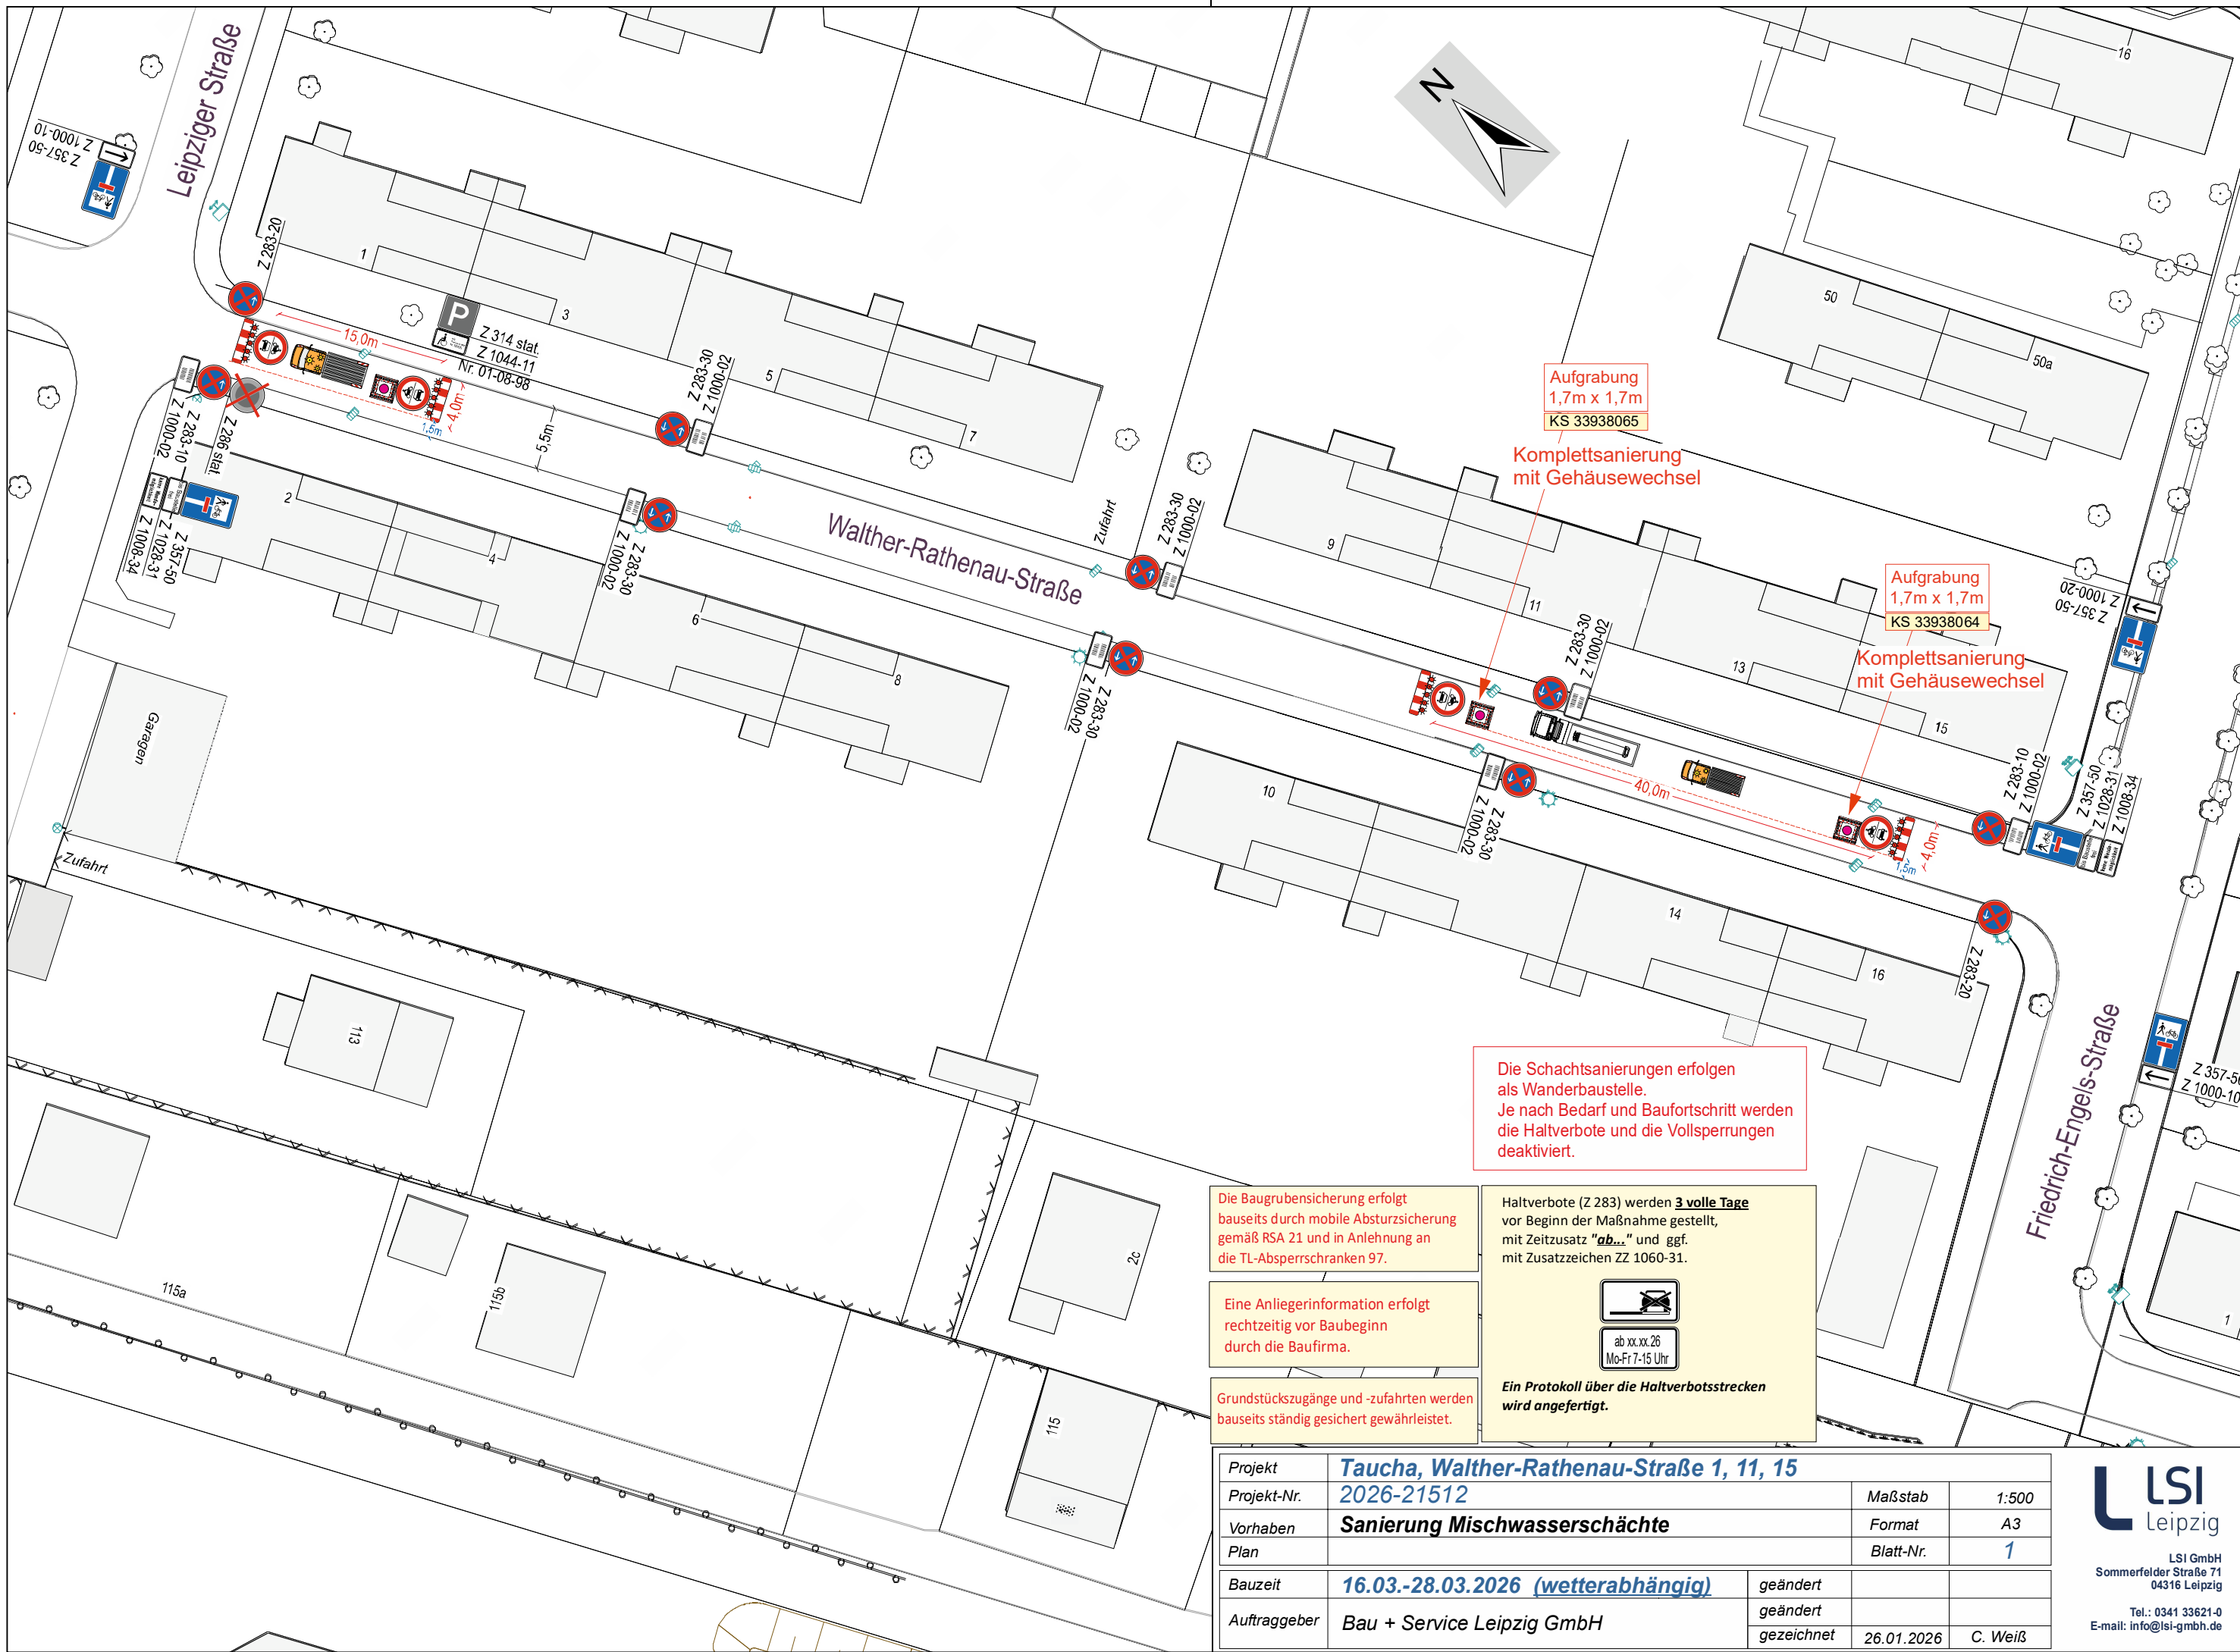

Die Schachtsanierungen erfolgen als Wanderbaustelle. Je nach Bedarf und Baufortschritt werden die Haltverbote und die Vollsperrungen deaktiviert.

Die Baugrubensicherung erfolgt bauseits durch mobile Absturzsicherung gemäß RSA 21 und in Anlehnung an die TL-Absperrschranken 97.

Eine Anliegerinformation erfolgt rechtzeitig vor Baubeginn durch die Baufirma.

Grundstückszugänge und -zufahrten werden bauseits ständig gesichert gewährleistet.

Haltverbote (Z 283) werden **3 volle Tage** vor Beginn der Maßnahme gestellt, mit Zeitzusatz "ab..." und ggf. mit Zusatzzeichen ZZ 1060-31.



Ein Protokoll über die Haltverbotsstrecken wird angefertigt.

Projekt	Taucha, Walther-Rathenau-Straße 1, 11, 15		
Projekt-Nr.	2026-21512	Maßstab	1:500
Vorhaben	Sanierung Mischwasserschächte	Format	A3
Plan		Blatt-Nr.	1
Bauzeit	16.03.-28.03.2026 (wetterabhängig)	geändert	
Auftraggeber	Bau + Service Leipzig GmbH	gezeichnet	26.01.2026 C. Weiß
